



REGIONE PUGLIA



UNIONE EUROPEA

COMUNE DI NEVIANO


PROVINCIA DI LECCE

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
IMPIANTISTICO SPORTIVO
CAMPO NEVIANO "SALVATORE IMPERIALE"
Progetto esecutivo €. 350.000,00**

PROGETTAZIONE

UFFICIO TECNICO
ing. Roberta Napoli

*Il coordinatore per
la sicurezza in fase
di esecuzione*
**arch. Daniele
Cataldo**

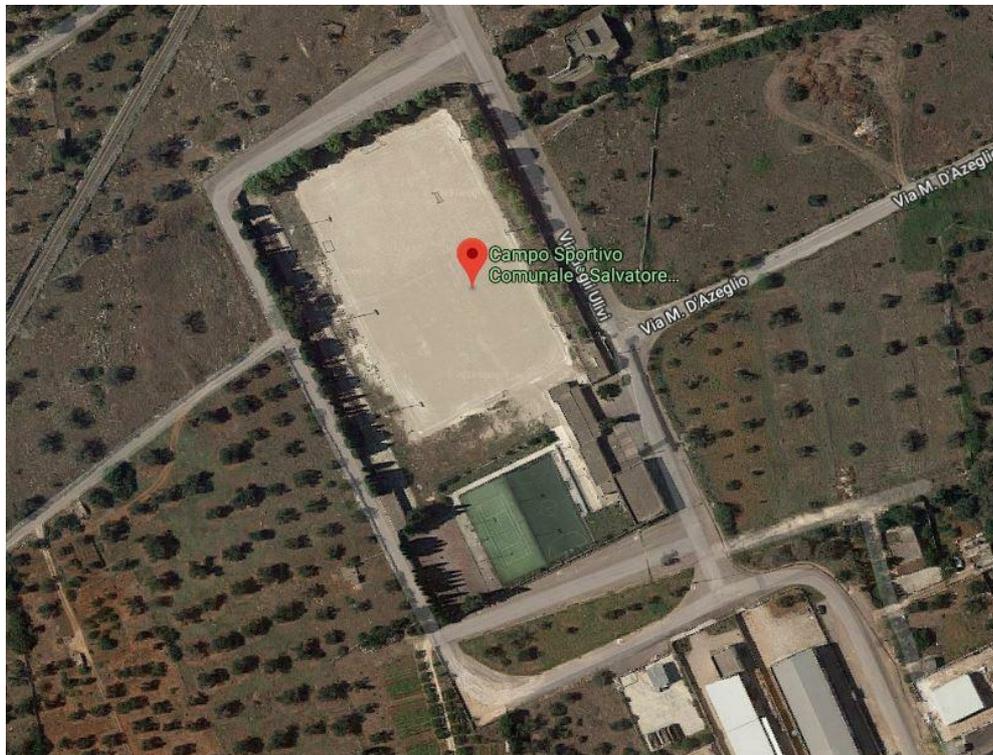

DATA

Febbraio 2020

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATO
ALLEGATO H

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento

Comune di Neviano
Provincia di LE

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di Riqualificazione del Patrimonio Impiantistico Sportivo Campo Neviano "Salvatore Imperiale". Importo progetto € 350.000,00

COMMITTENTE: Comune di Neviano

CANTIERE: Via Massimo D'Azeglio, Neviano (LE)

Neviano, 08/02/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(arch. Daniele Cataldo)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(Sindaco pro-tempore Cafaro Silvana)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	4	4	06/04/2020	09/04/2020
Scavo di sbancamento	1	1	7	12	09/04/2020	20/04/2020
Scavo a sezione obbligata	1	1	10	15	20/04/2020	04/05/2020
Formazione di fondazione stradale	1	1	15	19	04/05/2020	22/05/2020
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	1	10	15	22/05/2020	05/06/2020
Posa di pavimenti per esterni	1	1	14	20	05/06/2020	24/06/2020
Posa di recinzioni e cancellate	1	1	8	10	24/06/2020	03/07/2020
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	4	03/07/2020	06/07/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Edile e Impiantistica

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

